

出来形測定結果総括表


令和〇〇年度

工 事 名 デキスパート サンプルデータ

受 注 者

株式会社 ○×建設

工 種	項 目	規 格 値	社内規格値	現場規格値	測 定 頻 度	出 来 形 測 定 結 果				規格値の50%以内		規格値の80%以内		備 考	
						測定回数	設計値との差			50%以内/総数	率	80%以内/総数	率		
							最大値	最小値	平均値						
掘削工	基準高	±50mm		±30mm	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)土工編計測技術(断面管理の場合)」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基	1	0	0	0	1/1	100.0%	1/1	100.0%		
	基準高	+50mm -60mm		+30mm -36mm		2	-20	-45	-33	1/2	50.0%	2/2	100.0%		
	法長	-300mm		-180mm		4	-21	-250	-143	2/4	50.0%	2/4	50.0%		
コンクリート擁壁工	基準高	±35mm	-25mm	±21mm	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。	45	+12	-13	0	45/45	100.0%	45/45	100.0%		
	幅	±20mm	-15mm	±12mm		45	+10	-8	+3	45/45	100.0%	45/45	100.0%		
	幅	-50mm	-40mm	-30mm		45	+18	-15	0	45/45	100.0%	45/45	100.0%		
	幅	-50mm	-40mm	-30mm		45	+10	-9	0	45/45	100.0%	45/45	100.0%		
	控壁厚さ	-30mm	-25mm	-18mm		45	+17	-16	+4	44/45	97.8%	45/45	100.0%		
	高さ	-20mm	-15mm	-12mm		45	+12	-16	+5	43/45	95.6%	45/45	100.0%		
	距離	±50mm		±30mm		45	+50	0	+25	28/45	62.2%	37/45	82.2%		

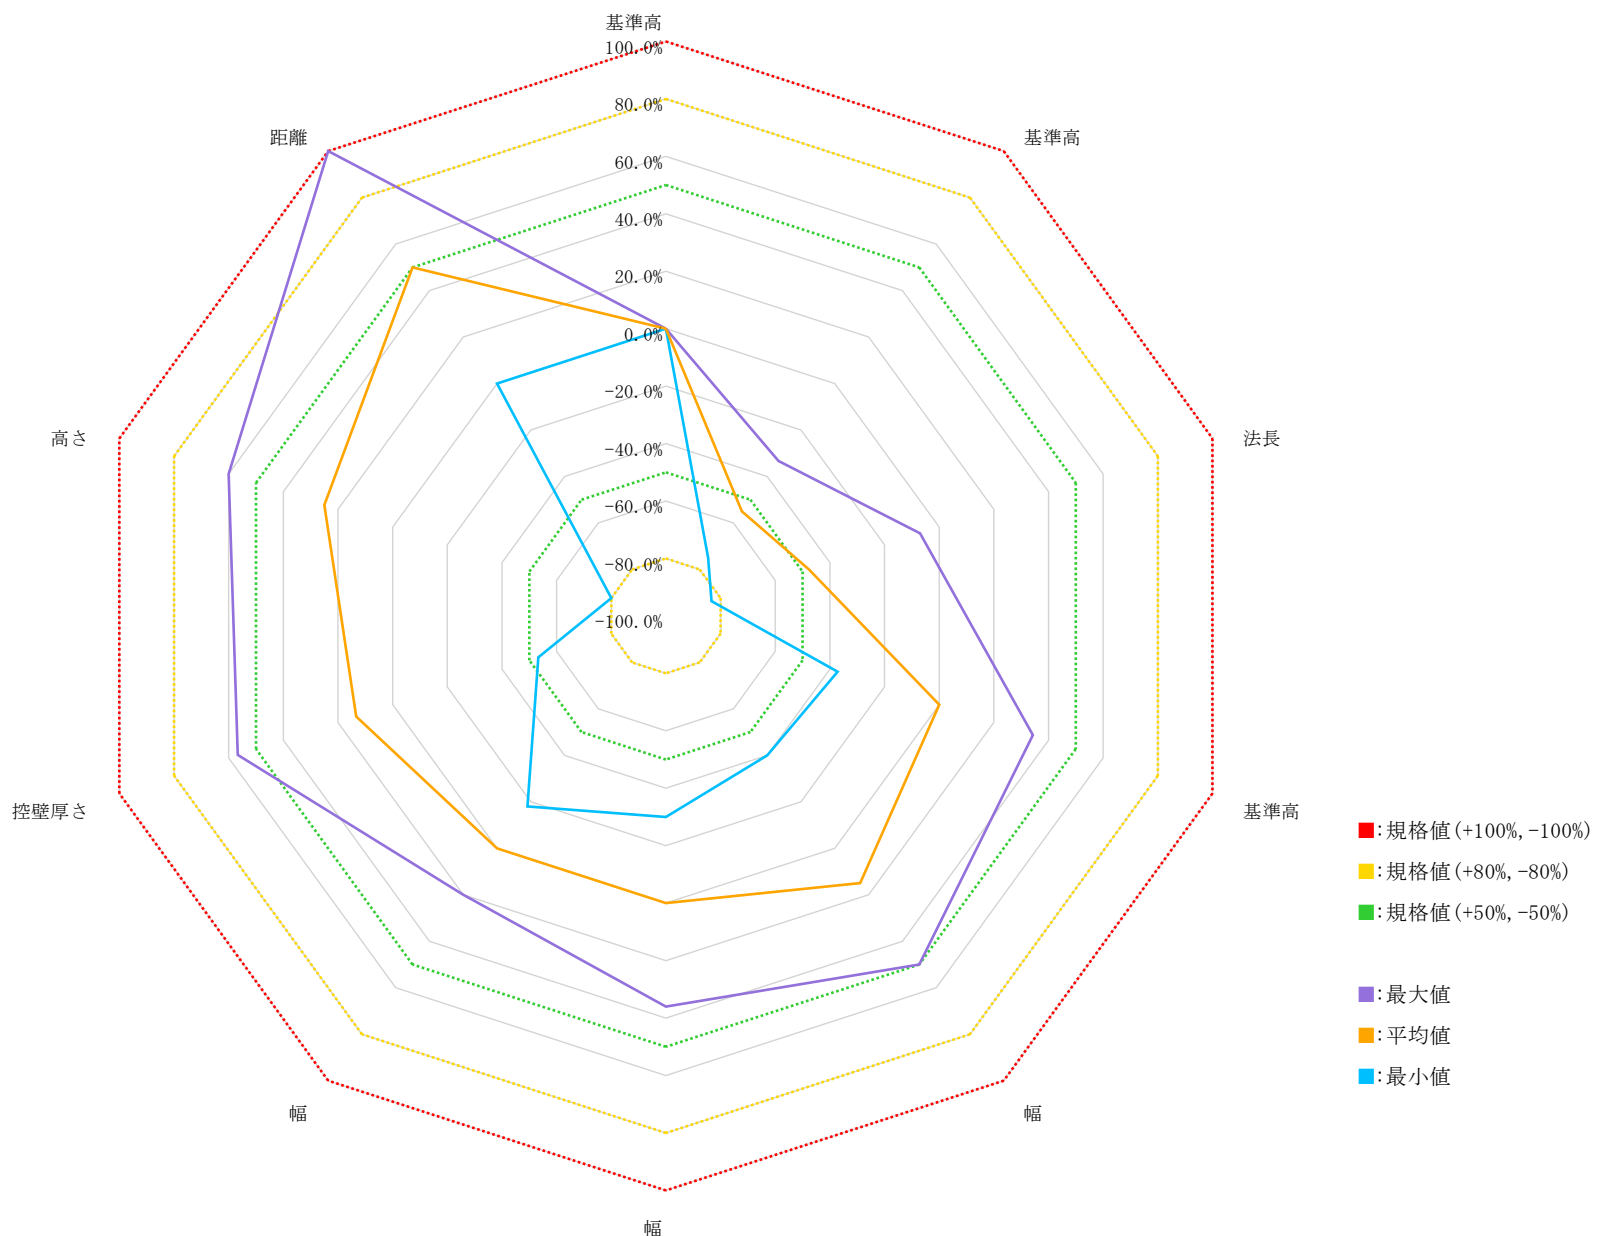

※設計値と規格値の差が無い項目は、レーダーチャートに描画しません。
